



## 1 Analyse préliminaire

#### 1.1 Introduction

Le projet « Application web de gestion pour une association de soutien scolaire » est un projet que je fais dans le cadre de mon CFC en informatique à Ste-Croix.

Le principe du projet est la création d'un site web qui permettra la gestion et la planification de stage de révision durant les vacances scolaires pour les élèves.

Sur le site il y a la possibilité pour les parents d'inscrire leurs enfants à un ou plusieurs stages.

Il y aura aussi toute la gestion du coté des administrateurs / enseignants pour la gestion CRUD (Create, Read, Update, Delete) des stages et la validation des comptes pour les parents.



## 1.2 Planification initiale

### Le bleu pour la documentation

### Le vert pour les tests

### L'orange pour les analyses

### Le blanc pour les implémentations

N°	_	lode âche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Mai 2024   Juin 2024   22   25   28   01   04   07   10   13   16   19   22   25   28   31   03
1	*		Préparation du Projet	7 heures	30.04.24 08:00	02.05.24 08:10	
2	*		Création du MCD	2.5 heures	02.05.24 08:10	02.05.24 13:35	
3	*		Documentation du MCD	1 heure	02.05.24 13:35	02.05.24 14:35	1
4	*		Création du MLD	3 heures	02.05.24 14:35	03.05.24 08:40	li l
5	*		Documentation du MLD	1.5 heures	03.05.24 08:40	03.05.24 10:10	1
6	*		Création du script pour la DB	2 heures	03.05.24 10:10	03.05.24 12:10	
7	*		Création des use case et scénarios	2.5 heures	03.05.24 12:10	03.05.24 15:55	
8	*	-	Création du gabarit du site en PHP	3 heures	03.05.24 15:55	06.05.24 10:00	
9	*	-	Création du home.php	3 heures	06.05.24 10:00	06.05.24 14:15	
10	*		Documentation de la page home.php	1 heure	06.05.24 14:15	06.05.24 15:15	I I
11	*	-	Test de connexion entre le site et la DB	1 heure	06.05.24 15:15	07.05.24 08:10	II II
12	*		Ajout "description des stage" dans la page home.php	2 heures	07.05.24 08:10	07.05.24 10:10	•
13	*		Documentation de la page home.php	1 heure	07.05.24 10:10	07.05.24 11:10	1
14	*		Ajout "liste des stages" dans home.php	3 heures	07.05.24 11:10	07.05.24 15:25	
15	*		Documentation de la page home.php	0.5 heure	07.05.24 15:25	07.05.24 15:55	
16	*		Recherche pour le système de recherche	1 heure	07.05.24 15:55	13.05.24 08:50	
17	*		Ajout du système de recherche sur home.php	3 heures	13.05.24 08:50	13.05.24 11:50	•
18	*		Test du système de recherche	1 heure	13.05.24 11:50	13.05.24 14:05	T T
19	*		Documentation du système de recherche	1.5 heures	13.05.24 14:05	13.05.24 15:35	T I
20	*		Ajout d'une page login.php	3 heures	13.05.24 15:35	14.05.24 10:30	
21	*		Test pour les connexions au site	1.5 heures	14.05.24 10:30	14.05.24 12:00	I
22	*		Création de la page test de gestion du site pour les administrateurs	3 heures	14.05.24 12:00	16.05.24 08:10	
23	*		Documentation du login.php	1 heure	16.05.24 08:10	16.05.24 09:10	
24	*		Tests pour le login	1 heure	16.05.24 09:10	16.05.24 10:10	
25	*		Documentation des tests	0.5 heure	16.05.24 10:10	16.05.24 13:35	




N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	22   25   28	Mai 2024 01 04 07	10	13   16   19   22	2 25 28	Juin 2024 31 03
26	*	Analyse pour la gestion de mail automatique	2 heures	16.05.24 13:35	16.05.24 15:35				1		
27	*	Documentation pour les mails automatiques	1 heure	16.05.24 15:35	16.05.24 16:35				1		
28	*	Réflexion pour la mise en place des inscriptions	1 heure	16.05.24 16:35	17.05.24 08:40				н		
29	*	Création de la page d'inscription des parents	2.5 heures	17.05.24 08:40	17.05.24 11:10				1		
30	*	Ajout confiration d'insciption pour les administrateurs	2 heures	17.05.24 11:10	17.05.24 14:25				1		
31	*	Test d'envois de mail	1.5 heures	17.05.24 14:25	17.05.24 15:55				1		
32	*	Création de la page d'inscription à un stage	2 heures	17.05.24 15:55	21.05.24 09:00						
33	*	Test pour une inscription à un stage	1 heure	21.05.24 09:00	21.05.24 10:00				1		
34	*	Documentation page d'inscription pour un stage	1 heure	21.05.24 10:00	21.05.24 11:00				1		
35	*	Préparation de la page de gestion admin	1 heure	21.05.24 11:00	21.05.24 12:00				I		
36	*	Ajout dans la page des administrateurs pour la création de stage	2 heures	21.05.24 12:00	21.05.24 15:15						
37	*	Ajout de la gestion du status des stages pour les administrateurs	2 heures	21.05.24 15:15	23.05.24 09:10						
38	*	Test du centre d'administation	2.5 heures	23.05.24 09:10	23.05.24 14:35						
39	*	Documentation de la gestion des stage pour les administrateurs	1 heure	23.05.24 14:35	23.05.24 15:35				- 1		
40	*	Préparation pour la mise en place de la gestion des comptes utilisateurs	1 heure	23.05.24 15:35	23.05.24 16:35				1		
41	*	Ajout de la gestion des comptes utilisateurs par les administrateurs	5 heures	23.05.24 16:35	24.05.24 13:55				-	•	
42	*	Documentation de la gestion des comptes utilisateurs	1 heure	24.05.24 13:55	24.05.24 14:55					I	
43	*	Vérification des tests effectuer	4 heures	24.05.24 14:55	27.05.24 15:30						
44	*	Création de la documentation pour la procédure d'installation	3 heures	27.05.24 15:30	28.05.24 10:25					н	
45	*	Création de la documentation pour la procédure de mise en service	3 heures	28.05.24 10:25	28.05.24 14:40					•	



# 2 Analyse / Conception


## 2.1 Concept

## **MCD**

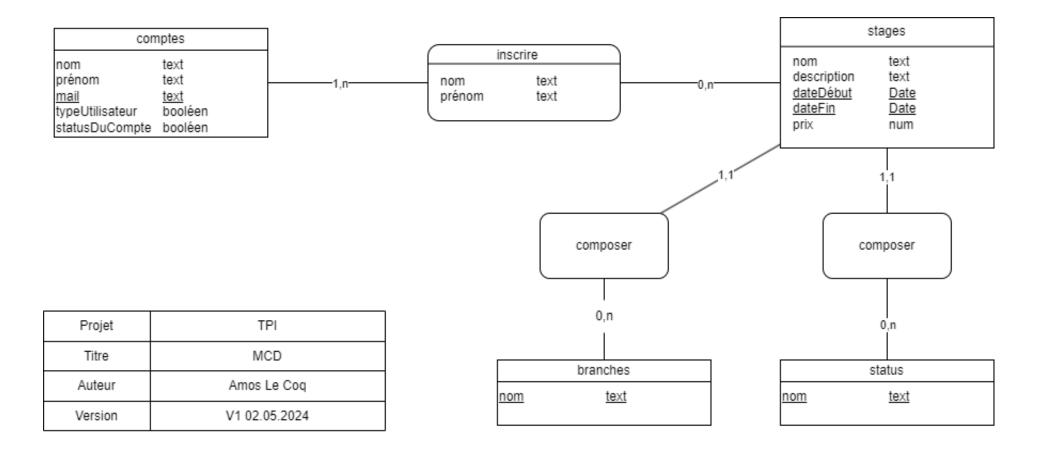




## **MLD**

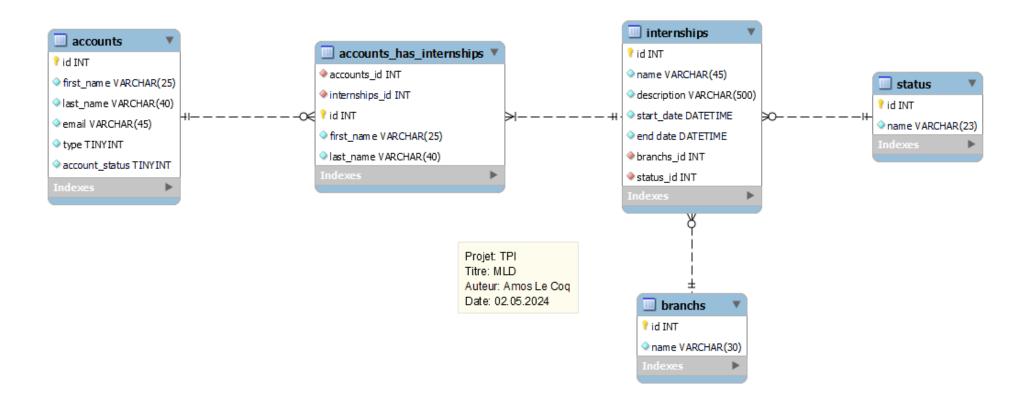



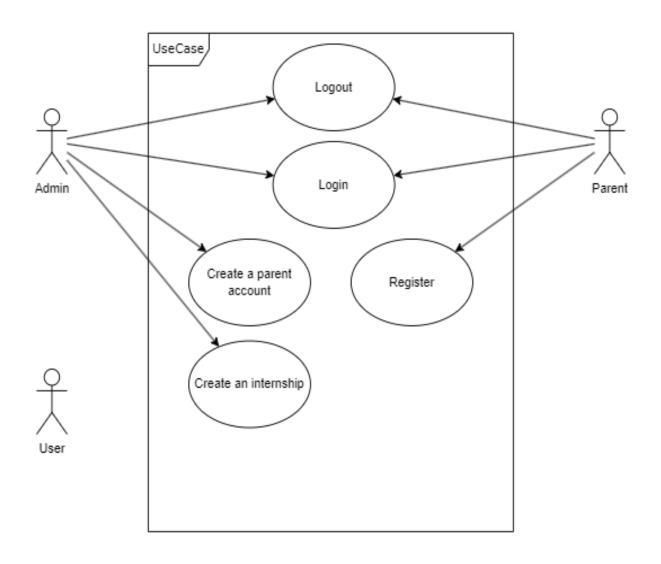



	<b>O</b> 4 4			
	S+1-0+	$\alpha$	$\alpha$	1001
2.2	Strat	CUIC	ue	116-51

## 2.3 Risques techniques

### 2.4 Planification

### 2.5 Dossier de conception

## 3 Réalisation

#### 3.1 Dossier de réalisation

#### 3.1.1 Création du MCD

Pour la création du MCD dans l'entité « compte » j'ai ajouté « statusDuCompte » en booléen pour pouvoir faire la validation du compte pour les administrateurs (temps que le compte n'est pas validé on ne peut pas se connecter)

#### 3.1.2 Création du MLD

- 3.2 Description des tests effectués
- 3.3 Erreurs restantes
- 3.4 Liste des documents fournis
- 4 Conclusions

### 5 Annexes



- 5.1 Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation
- 5.2 Sources
